


SAP Business One

Projekt kontrolling bővítmény

04 / 10 / 2023



Molnár Zoltán





Projekt AddOn on HANA

Kiterjeszhető projekt controlling rendszer



Könnyebb adatkezelés

Automatizmusok segítik a bizonylatok rögzítését

Új bizonylattípusok megjelenése

Egyedi projekt elemzések



Testreszabott KPI-ok

Több szintű projektkezelés

Terv és tényadatok követése, rugalmas perióduskezeléssel

Az elemzések érdekében részletezésekkel

Kontrolling adatok kihasználva a HANA erejét



SBO-n kívüli adatok kezelése

Könnyebb nyitóadat importálás

Elég az adatokat a HANA rendszerbe bejuttatni

Intranet rendszerek kapcsolódása





Automatizmusok

Mert a kollégák munkaideje túl drága a felesleges adminisztrációhoz és dupla adatrögzítéshez...

Projekt törzs alapján

Profitcenterek, costcenterek kitöltése a bizonylatsorokon.

Projekt szinten definiálható és vezérelhető, hogy automatikusan bekínálja-e az egyéb kontrolling dimenzióértékeket a bizonylatokon projekt kód kiválasztást követően.

Fej adat alapján

Projekt kód és költségvetési sor kitöltése a bizonylatsorokon.

A bizonylat fej adatban megadott projekt kódot és költségvetési sort automatikusan bekínálja a sorokba is az AddOn, amitől a felhasználó akár el is térhet.

Projekt bevételek

Előre rögzített számla tervezetek a mérföldköveknek megfelelően

Az ablak segítségével szerződéskötéskor rögzíthetők a tervezett számlák, mérföldkövek, melyek áttekinthetők – a már kiállított számlákkal egyetemben, akár projektre szűrve is.



Automatizmus

Projekt törzs alapján egyéb kontrolling dimenziók kitöltése bizonylatokon

Projekt

Projekt kód	<input type="text" value="30003723"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív
Projekt név	<input type="text"/>	
Projekt leírás	<input type="text"/>	
Periódus típus	<input type="text" value="Év"/>	
Főprojekt kód	<input type="text" value="300037"/>	
Főprojekt név	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Csak szerződésen alapuló beszerzési bizonylatok befogadása	

Általános

Menedzsment

Megbízó

Dátumok és becslések

Visszatartások és Bankgarancia

Pénzügy

Ktghely	<input type="text" value="23"/>	<input checked="" type="checkbox"/> beszerzés	<input checked="" type="checkbox"/> értékesítés
Rendszám	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> beszerzés	<input type="checkbox"/> értékesítés

Automatizmus

Bizonylat fej adatok alapján tétel adatok kitöltése

Könyvelés

Mellékletek

Üzletipartner-projekt 11000111
Költségvetési sor 24
Költségvetési sor neve Tartálytisztítás

Tartalom

Logisztika

Könyvelés

Mellékletek

Cikk-/szolgáltatásfajta Cikk

#	Típus	Cikkszám	Cikk leírása	Mennyiség	Egységár	Enge...	Adó kód	Összesen (SP)	Ktghely	Rendszám	Projekt	Tets...	Költségvetési...	Költségvetési ...	K...
1		10G09001		1	9.345,25 Ft	0,0000	127	9.345 Ft	11		11000111	24	Tartálytisztítás		
2		10G09103		1	17.578,00 Ft	0,0000	127	17.578 Ft	11		11000111	24	Tartálytisztítás		
3		10G39010		1		0,0000	127		11		11000111	24	Tartálytisztítás		
4		10G51011		1		0,0000	127		11		11000111	24	Tartálytisztítás		
5						0,0000	127								

Összefoglalás típusa Nincs összefogl...



Automatizmus

Projekt mérföldkövek rögzítése, áttekintése, egy klikkeléssel számlázása

Projekt bevételek

Projekt: Időszak: -TÓL -IG

Számlák:

Bizonylatszám	Vevő	Vevőnév	Projektkód	Projektnév	Költségvetési sor	Költségvetési sor neve	Könyvelési dátum	Bizonylat dátum	Esedé...
1000058	3110909	...	30003723	...	3	fizetős	2021.08.02	2021.08.23	2021.09.1
1000085	3110056	...	14004025	...	5	fizetős	2021.08.03	2021.08.24	2021.09.1
1000051	3110190	...	23002223	...	3	fizetős	2021.08.03	2021.08.23	2021.09.1
1000032	3110455	...	16004225	...	9	vegyszer	2021.08.03	2021.08.16	2021.10.1
1000090	3111805	...	31001625	...	5	fizetős	2021.08.03	2021.08.24	2021.09.1
1000021	3120011	...	99007723	...	3	fizetős	2021.08.03	2021.08.13	2021.08.1
1000360	3120011	...	99007723	...	3	fizetős	2021.08.03	2021.09.16	2021.09.1
1000091	3110164	...	16005625	...	9	vegyszer	2021.08.04	2021.08.24	2021.10.1
1000043	3110190	...	23005323	...	3	fizetős	2021.08.04	2021.08.23	2021.09.1
1000064	3110582	...	29005523	...	3	fizetős	2021.08.04	2021.08.23	2021.09.1
1000235	3111104	...	99082723	...	3	fizetős	2021.08.04	2021.09.03	2021.10.1
1000033	3111497	...	16006125	...	9	vegyszer	2021.08.04	2021.08.16	2021.10.1
1000034	3111497	...	16006125	...	9	vegyszer	2021.08.04	2021.08.16	2021.10.1
1000038	3111980	...	16006325	...	9	vegyszer	2021.08.04	2021.08.16	2021.10.1
1000040	3111980	...	16006325	...	9	vegyszer	2021.08.04	2021.08.16	2021.10.1
1000376	3110013	...	12000724	...	7	fizetős	2021.08.05	2021.09.16	2021.11.1

Tervezetek:

Bizonylatszám	Vevő	Vevőnév	Projektkód	Projektnév	Költségvetési sor	Költségvetési sor neve	Könyvelési dátum	Bizonylat dátum	Esedékesség dátuma	M.

OK Mégsem Új tervezet...



Új bizonylattípusok

Ha egy adat bekerül, azt több szemszögből is meg lehet vizsgálni...

A dolgozói és gép rezsioradíjak akár időszakosan is meghatározhatók törzsadat szinten

Gépnapló

Az erőforrások, gépek költségeinek projektre terhelése

Az ablak segítségével gép megközelítéssel lehet áttekinteni és rögzíteni az adott gép adott időszaki munkáit projektekre, költségvetési sorokra.

Jelenléti ív

A dolgozók költségeinek projektre terhelése

Az ablak segítségével dolgozó megközelítéssel lehet áttekinteni és rögzíteni az adott dolgozó adott időszaki munkáit projektekre, költségvetési sorokra.

Projekt napló

A projekt költségeinek áttekintése és rögzítése

Az ablak segítségével projekt megközelítéssel lehet áttekinteni és rögzíteni az adott projekt adott időszaki jelenléti ív és gépnapló terheléseit projektekre, költségvetési sorokra.



Új bizonylattípus

Génapló, géptörzs, rezsióradíjak

Napló

Gép → [dropdown] [dropdown] [dropdown] tgc Dátum 2023.07.01 -TÓL 2023.07.31 -IG

Projekt kód	Projekt neve	Költségvet...	Költségvetési ...	Dátum	Időtart...	Megjegyzés	Igazolva
[dropdown]	[dropdown]	3	fizetős	2023.07.14	325,00		<input checked="" type="checkbox"/>

Erőforrás törzsadatai

Erőforrászám: Manuális [dropdown] Vonalkód: [dropdown]
Leírás: [dropdown] tgc
Név idegen nyelven: [dropdown]
Erőforrástípus: Gép
Erőforráscsoport: Erőforrások
Mértékegység szövege: [dropdown]
Idő/erőforrás egység: [dropdown]

Általános Kapacitás adatok

Kiadási módszer: [dropdown] Re
Erőforrás-hozzárendelés: [dropdown] Ke
Cikkhez kapcsolva: [dropdown]

Aktív Inaktív Speciális

TÓL: [dropdown]

Aktualizálás Mégsem

Óradíjak

Típus: Erőforrás [dropdown]
Óradíjak: [dropdown] [dropdown] [dropdown] tgc

Dátumtól	Dátumig	Óradj	Megjegyzés
2022.01.01	2022.06.30	190,00	
2022.07.01	2022.12.31	240,00	
2023.01.01		350,00	
		0,00	

Hozzáadás Mégsem

OK Mégsem

Óradíjak...

0 2M 4M 6M

5 látoaatott vevő



Új bizonylattípus

Jelenléti ív, dolgozói törzs, rezsióradíjak

Napló

Dolgozó: 44 Dátum: 2023.01.01 -TÓL 2023.07.31 -IG

Projektkód	Projekt neve	Költségvet...	Költségvetési ...	Dátum	Időtart...	Megjegyzés	Igazolva
29001223	...	3		2023.01.02	1,00	Munkalap: 90692	✓
37006023	...	3		2023.01.11	6,00	Munkalap: 91167	✓
37006023	...	3		2023.01.18	3,00	Munkalap: 91481	✓
26000923	...	3		2023.01.24	1,00	Munkalap: 91833	✓
26001123	...	3		2023.01.24	1,00	Munkalap: 91834	✓
12012723	...	3		2023.01.27	2,00	Munkalap: 91920	✓
12001423	...	3		2023.01.27	1,00	Munkalap: 91938	✓
99004223	...	3		2023.01.31	1,00	Munkalap: 92083	✓
26000523	...	3		2023.01.31	2,00	Munkalap: 92082	✓
29002523	...	3		2023.02.02	1,00	Munkalap: 92168	✓
12023424	...	7		2023.02.07	1,00	Munkalap: 92363	✓
12023424	...	7		2023.02.07	1,00	Munkalap: 92362	✓
42002823	...	3		2023.02.08	5,00	Munkalap: 92455	✓
12001124	...	7		2023.02.13	4,00	Munkalap: 92655	✓
99000423	...	3		2023.02.14	1,00	Munkalap: 92797	✓
19002623	...	3		2023.02.15	5,00	Munkalap: 92843	✓
26001423	...	1		2023.02.21	6,00	Munkalap: 93118	✓
11008024	...	7		2023.02.27	4,00	Munkalap: 93398	✓
11008024	...	7		2023.02.27	1,00	Munkalap: 93395	✓
12006423	...	3		2023.04.19	2,00	Munkalap: 95585	✓
26001123	...	3		2023.05.02	2,00	Munkalap: 96169	✓
29006323	...	3		2023.05.09	2,00	Munkalap: 96520	✓
26000523	...	3		2023.05.15	6,00	Munkalap: 96809	✓
12005023	...	3		2023.05.19	4,00	Munkalap: 97040	✓
37006123	...	3		2023.05.26	2,00	Munkalap: 97482	✓
37009223	...	1		2023.06.02	3,00	Munkalap: 97892	✓
37009223	...	1		2023.06.05	2,00	Munkalap: 97894	✓
99009923	...	3		2023.06.15	2,00	Munkalap: 04015	✓

OK Mégsem

0 2M 4M 6M

p 5 látogatott nevő

Dolgozói törzsatadatok

Utónév: [] Dolgozó kódja: 1447
Középső név: [] Külső dolgozósám: []
Családnév: [] Aktív dolgozó
Munkakör megnevezése: []
Beosztás: [] Munkahelyi telefon: []
Osztály: Szerviz Mellék: []
Kirendeltség: [] Mobiltelefon: []
Menedzser: [] Személyhívó: []
Felhasználókód: [] Otthoni telefonszám: []
Értékesítő: [] Fax: []
Költséghely: []

Óradíjak

Cím: Munkahelyi cím
Utca: []
Házszám: []
Zárolás: []
Épület/emelet/ajtó: []
Irányítószám: []
Helység: []
Megye: []
Állam: []
Ország/régió: []

Típus: Óradíjak Dolgozó: 44

Dátumtól	Dátumig	Óradíj	Megjegyzés
2022.01.01	2022.12.31	10.000,00	
2023.01.01		12.500,00	

Hozzáadás Mégsem

OK Mégsem Óradíjak...

Késedelmes kötelezettségek

22M

-147%



Projekt elemzések

Az azonnali, pillanatnyi adat felbecsülhetetlen érték...

Korlátlanul

Tetszőleges számú elemzés készíthet felhasználói igények alapján

Az elemzések dolgozhatnak a projekt KPI adatkockáiból is, de akár más adatforrásokból is. Semmi sincs megkötve a riportokban. Indítható akár a projekt törzsadataitól is.

Szofisztikált szűrés

Az elemzésekhez megadható, hogy melyik szűrési fülekre lesz szükség.

Az elemzések nagy előnye, hogy olyan szofisztikált szűrési feltételeket hozhatunk létre vele, melyeket más eszközökkel ilyen rugalmasan nem lehet kezelni.

Sárga nyilak

Előre rögzített számla tervezetek a mérföldköveknek megfelelően

A sárga nyilak segítségével könnyedén navigálhatunk az elemzésekből törzsadatokhoz, vagy bizonylat adatokhoz. Sőt, akár egy összesített adat részleteit is elemezhetjük a segítségével..



Projekt elemzés

Szűrési képernyő

Projekt eredmény Összesített

Projekt -TÓL -IG Dátum TÓL
 Dátum IG

Státusz
 Fázis
 Tevékenység
 Költséghely

Projekt	ÜP	Ckk	Raktár	Bizonylat	Főkönyv	Dolgozók	Riport leírás
<input type="checkbox"/> Főprojekt	<input type="text"/>					<input type="checkbox"/> Esély (%)	<input type="text" value="0,0000"/> <input type="text" value="0,0000"/>
<input type="checkbox"/> Megbízó	<input type="text"/>	<input type="text"/> -TÓL	<input type="text"/> -IG	<input type="checkbox"/> Ajánlat kérés dátuma	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ajánlat dátuma	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Aszisztens	<input type="text"/>	<input type="text"/> -TÓL	<input type="text"/> -IG	<input type="checkbox"/> Ajánlat érvényessége	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Megrendelés dátuma	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Projekt vezető	<input type="text"/>	<input type="text"/> -TÓL	<input type="text"/> -IG	<input type="checkbox"/> Szerződés dátuma	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Projekt kezdése	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Szerelésvezető	<input type="text"/>	<input type="text"/> -TÓL	<input type="text"/> -IG	<input type="checkbox"/> Befejezési határidő	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárás dátuma	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Szereésvezető (ÜP)	<input type="text"/>	<input type="text"/> -TÓL	<input type="text"/> -IG	<input type="checkbox"/> Létrehozás dátuma	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Értékesítő	<input type="text"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Költséghely	<input type="text" value="17"/> -TÓL	<input type="text" value="17"/> -IG					
<input type="checkbox"/> Rendszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

OK Mégsem



Projekt elemzés

Eredmény képernyő

Projekt Eredmény Riport - tételes nézet

megje...	Érték IP-ben	IP pénznem	Ellenszámla...	Ellenszámla...	Ellenszámla...	Ellenszámla...	Normál ár...	Belső árbe...	Árbevétel ...	Anyagköltség	Közvetítet...	Igénybe v...	Bérlőköltség	Egyéb költ...	Összes ktg	Fedezet
terelési munk	0,00				5410532	Normál ár...	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-385.000,00
ri igazolván	20,00	EUR			5410732	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	7.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,00	-7.522,00
szóló rends	1.827,50	EUR			3110010	Árbevétel ...	686.171,00	0,00	686.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.171,00	0,00
ejezetlen k	0,00		23100000	Ellenszámla...			0,00	-385.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
ejezetlen k	0,00		23100000	Ellenszámla...			0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
aeus 21. ré	4.488,00	EUR			3190002	Normál ár...	1.771.055,00	0,00	1.771.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.055,00
olaj SIP-64	0,00				5410448	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.934,00	35.934,00	-35.934,00
ópályadój, c	0,00				5410448	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00	3.931,00	-3.931,00
ópályadój, c	0,00				5410448	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.993,00	35.993,00	-35.993,00
" SCHELL k	0,00				5410365	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	-9.860,00
N d63-2" K	0,00				5410292	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	80.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.548,00	-80.548,00
3B JS 588	68,92	EUR			5410533	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	27.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.368,00	-27.368,00
észeti szer	2.150,00	EUR			5410388	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	848.433,00	0,00	0,00	0,00	848.433,00	-848.433,00
anyag va	0,00				5410448	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,00	21.266,00	-21.266,00
olaj SIP-64	0,00				5410448	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.471,00	30.471,00	-30.471,00
ópályadój S:	0,00				5410448	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00	3.914,00	-3.914,00
projektre	0,00		70000000	Ellenszámla...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.340,00	0,00	460.340,00	-460.340,00
lás 2 fő 20	719,73	EUR			5460018	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.950,00	287.950,00	-287.950,00
atrica Mag	0,00				5460016	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.830,00	69.830,00	-69.830,00
övő számlál	0,00				5410478	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	-38.000,00
manag,kárl	0,00				5410448	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
projektre	0,00		70000000	Ellenszámla...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.690,00	0,00	920.690,00	-920.690,00
projektre	0,00		70000000	Ellenszámla...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.208,00	0,00	432.208,00	-432.208,00
000523.Av	-6.264,11	EUR	48220000	Ellenszámla...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.817,00	0,00	0,00	2.443.817,00	2.443.817,00
M 20/ 1/2"	0,00				5410292	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	-13.380,00
észeti szer	5.175,00	EUR			5410388	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.983,00	0,00	0,00	0,00	1.965.983,00	1.965.983,00
óth Antal	0,00				5410402	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	-673,00
víz SIP-64:	0,00				5410693	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.188,00	62.188,00	-62.188,00
aeus 22. ré	25.277,43	EUR			3190002	Normál ár...	9.677.717,00	0,00	9.677.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677.717,00
anyag, ki	0,00				5410448	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
300 visszac	145,26	EUR			5410533	Árbevétel ...	0,00	0,00	0,00	57.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.949,00	-57.949,00
projektre	0,00		70000000	Ellenszámla...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.131,00	0,00	795.131,00	-795.131,00
projektre	0,00		70000000	Ellenszámla...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.017,00	0,00	208.017,00	-208.017,00
projektre	0,00		70000000	Ellenszámla...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.380,00	0,00	136.380,00	-136.380,00
							10.741.003,00		10.741.003,00	1.301.473,00	2.851.577,00	5.862.672,00	6.423.899,00	6.959.494,00	3.399.115,00	7.341.888,00

OK

Mégsem



Többszintű projekt kezelés

Szint	Definíció	Kötelező	Terv adatok száma	KPI lehetőségek száma	Elemzésekben alkalmazható
Főprojekt	Összefogja a projekteket				Igen
Projekt	Szerződéses egység, önálló költségvetéssel	Igen	15	15	Igen
Költségvetési sor	Projekt alábontása		15	15	Igen





Terv és tényadatok (KPI) működése

Szint	Lehetséges db szám	Definiálható	Megtekinthető	Részletező tartozhat hozzá
Projekt terv adat	15	Választott periódustípus alapján	Bármilyen periódus típusra nézve	
Projekt tény adat	15		Bármilyen periódus típusra nézve	Igen
Költségvetési sor terv adat	15	Választott periódustípus alapján	Bármilyen periódus típusra nézve	
Költségvetési sor tény adat	15		Bármilyen periódus típusra nézve	Igen



Főprojekt

Főprojektek definiálása

#	Kód	Fő csoport Név
1	110001	...
2	110002	...
3	110003	...
4	110004	...
5	110006	...
6	110007	...
7	110008	...
8	110009	...
9	110010	...
10	110012	...
11	110013	...
12	110014	...
13	110015	...
14	110016	...
15	110017	...
16	110018	...
17	110020	...
18	110021	...
19	110023	...
20	110025	...
21	110026	...
22	110027	...
23	110029	...
24	110030	...
25	110031	...
26	110032	...

OK Mégsem



Projekt

Projekt általános adatok

Projekt

Projekt kód	11000111	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív	Státusz	Nyitott	
Projekt név	[Redacted]			Létrehozás dátuma	2021.01.01
Projekt leírás	[Redacted]			Fázis	Szerződött
Periódus típus	Év		Utolsó frissítés dátuma	2023.01.05	
Főprojekt kód	→ 110001				
Főprojekt név	[Redacted]				
	<input type="checkbox"/> Csak szerződésen alapuló beszerzési bizonylatok befogadása				

Általános | Menedzsment | Megbízó | Dátumok és becslések | Visszatartások és Bankgarancia | Pénzügy | Periódusok | Terv és tény adatok | Szerződések | Részletek | Csatolmányok

Esély (%)	0,0000
Tevékenység	[Redacted]
Elvégzendő munka	[Redacted]
Helyszín kódszám	1701
Projekt típusa	[Redacted]
Költséghely	[Redacted]
Tervezés	Nem
E-mail	[Redacted]

OK | Mégsem | Beszámoló



Projekt

Projekt megbízó adatok

Projekt

Projekt kód	11000111	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív	Státusz	Nyitott
Projekt név			Létrehozás dátuma	2021.01.01
Projekt leírás			Fázis	Szerződött
Periódus típus	Év		Utolsó frissítés dátuma	2023.01.05
Főprojekt kód	110001			
Főprojekt név				
<input type="checkbox"/> Csak szerződésen alapuló beszerzési bizonylatok befogadása				

Általános | Menedzsment | **Megbízó** | Dátumok és becslések | Visszatartások és Bankgarancia | Pénzügy | Periódusok | Terv és tény adatok | Szerződések | Részletek | Csatolmányok

ÜP kód	3110013
ÜP név	
Partner besorolása	
Kapcsolattartó	0
Fő ügyfél	

Távolság (Km)	0,000
Kiszállási díj	68.669,00
Utazási díj	0,00
Óradj	7.659,00

Túlóra engedélyezett

50% túlóra TÓL	
100% túlóra TÓL	
100% túlóra IG	

Munkalap auto-lezárás

Aktualizálás | Mégsem | Beszámoló



Projekt

Projekt dátum és becslés adatok

Projekt

Projekt kód: 11000111 Aktív

Projekt név: [Empty field]

Projekt leírás: [Empty field]

Státusz: Nyitott

Létrehozás dátuma: 2021.01.01

Fázis: Szerződött

Utolsó frissítés dátuma: 2023.01.05

Periódus típus: Év

Főprojekt kód: 110001

Főprojekt név: [Empty field]

Csak szerződésen alapuló beszerzési bizonylatok befogadása

Általános	Menedzsment	Megbízó	Dátumok és becslések	Visszatartások és Bankgarancia	Pénzügy	Periódusok	Terv és tény adatok	Szerződések	Részletek	Csatolmányok
Ajánlatkérés dátuma		2020.06.07		Projekt várható kezdete		2021.01.01				
Ajánlat kelte		2020.07.15		Tejlesztési határidő		2023.09.15				
Ajánlat érvényessége		2020.08.31		Lezárás dátuma						
Megrendelés dátuma		2020.08.19		Garancia vége						
Szerződés dátuma		2020.09.15								
Várható bevétel (pesszimista)		20.000.000,00		Várható költség (pesszimista)		19.000.000,00				
Várható bevétel (optimista)		49.500.000,00		Várható költség (optimista)		15.000.000,00				
Várható bevétel (reális)		35.000.000,00		Várható költség (reális)		18.000.000,00				

Aktualizálás Mégsem Beszámoló



Projekt

Visszatartások és bankgarancia

Projekt

Projekt kód: 11000111 Aktív

Projekt név: [redacted]

Projekt leírás: [redacted]

Státusz: Nyitott

Létrehozás dátuma: 2021.01.01

Fázis: Szerződött

Utolsó frissítés dátuma: 2023.01.05

Periódus típus: Év

Főprojekt kód: 110001

Főprojekt név: [redacted]

Csak szerződésen alapuló beszerzési bizonylatok befogadása

Általános | Menedzsment | Megbízó | Dátumok és becslések | **Visszatartások és Bankgarancia** | Pénzügy | Periódusok | Terv és tény adatok | Szerződések | Részletek | Csatolmányok

Visszatartások:

Jóteljesítési	10,0000 %
Szavatossági	5,0000 %
Garanciális	0,0000 %

Bankgaranciák:

Szerződésszám	Bank	Bank neve	Kezdet	Lejárta	Garancia összege	Csatolmány
A1923/55	107 - CIB Bank	CIB Bank	2021.01.01	2023.10.15	35.000.000,00	
					0,00	

Aktualizálás | Mégsem | Beszámoló

Projekt

Projekt és egyéb kontrollingdimenziók összekapcsolása

Projekt

Projekt kód	11000111	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív	Státusz	Nyitott
Projekt név			Létrehozás dátuma	2021.01.01
Projekt leírás			Fázis	Szerződött
Periódus típus	Év		Utolsó frissítés dátuma	2023.01.05
Főprojekt kód	110001			
Főprojekt név				
	<input type="checkbox"/> Csak szerződésen alapuló beszerzési bizonylatok befogadása			

Általános | Menedzsment | Megbízó | Dátumok és becslések | Visszatartások és Bankgarancia | Pénzügy | Periódusok | Terv és tény adatok | Szerződések | Részletek | Csatolmányok

Ktghely	11	<input checked="" type="checkbox"/> beszerzés	<input checked="" type="checkbox"/> értékesítés
Rendszám		<input type="checkbox"/> beszerzés	<input type="checkbox"/> értékesítés

Aktualizálás | Mégsem | Beszámolók



Projekt

Projekt periódusok és terv adatok

Projekt kód: 11000111 Aktív

Projekt név:

Projekt leírás:

Periódus típus: **Év**

Főprojekt kód: 110001

Főprojekt név:

Csak szerződésen alapuló beszerzési bizonylatok befogadása

Státusz: Nyitott

Létrehozás dátuma: 2021.01.01

Fázis: Szerződött

Utolsó frissítés dátuma: 2023.01.05

Általános	Menedzsment	Megbízó	Dátumok és becslések	Visszatartások és Bankgarancia	Pénzügy	Periódusok	Terv és tény adatok	Szerződések	Részletek	Csatolmányok					
Periódus	Megjegyzés	Időszak-TÓL	Időszak-IG	Zárva	Bevétel terv	Költség terv	Óraszám terv	Bevétel	Anyag ktg	Alvállalkozói ktg	Egyéb ktg	Összes könyvelt ktg	Bér ktg	Jármű ktg	Öss...
2021		2021.01.01	2021.12.31	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,000	4.761,00	632,00	0,00	23.624,00	24.256,00	0,00	0,00	24.
2022		2022.01.01	2022.12.31	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,000	4.720,00	84.740,00	0,00	0,00	84.740,00	1.325,00	0,00	489.
2023		2023.01.01	2023.12.31	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2024.01.01	2024.12.31	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2025.01.01	2025.12.31	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2026.01.01	2026.12.31	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aktualizálás Mégsem

Következő időszak generálása Beszámoló



Projekt

Projekt terv és tényadatok áttekintése

Projekt

Projekt kód: 11000111 Aktív

Projekt név:

Projekt leírás:

Státusz: Nyitott

Létrehozás dátuma: 2021.01.01

Fázis: Szerződött

Utolsó frissítés dátuma: 2023.01.05

Periódus típus: Év

Főprojekt kód: 110001

Főprojekt név:

Csak szerződésen alapuló beszerzési bizonylatok befogadása

Általános | Menedzsment | Megbízó | Dátumok és becslések | Visszatartások és Bankgarancia | Pénzügy | **Periódusok** | Terv és tény adatok | Szerződések | Részletek

Megjelentés: Év

Periódus: A - Teljes időszak
M - Hónap
Q - Negyedév
Y - Év

Terv számok:
Bevétel terv: 0,00
Költség terv: 0,00
Óraszám terv: 0,000

Tény számok:
Bevétel: 2.104.720,00
Anyag ktg: 84.740,00
Alvállalkozói ktg: 0,00
Egyéb ktg: 0,00
Összes könyvelt ktg: 84.740,00

Főkönyvi mutatók:
Bér ktg: 404.325,00
Jármű ktg: 0,00
Összes ktg: 489.065,00
Fedezet: 1.615.655,00
Fedezet %: 76,7634

Egyedi mutatók:
Óraszám: 184,500

Hónap: 2026-01
2021-01 - 2021-01
2021-11 - 2021-11
2022-01 - 2022-01
2022-05 - 2022-05
2022-07 - 2022-07
2023-01 - 2023-01
2024-01 - 2024-01
2025-01 - 2025-01
2026-01 - 2026-01

Év: 2023
2021 - 2021
2022 - 2022
2023 - 2023
2024 - 2024
2025 - 2025
2026 - 2026

Negyedév: 2026-Q1
2021-Q1 - 2021-Q1
2021-Q4 - 2021-Q4
2022-Q1 - 2022-Q1
2022-Q2 - 2022-Q2
2022-Q3 - 2022-Q3
2023-Q1 - 2023-Q1
2024-Q1 - 2024-Q1
2025-Q1 - 2025-Q1
2026-Q1 - 2026-Q1

Teljes időszak: *
* - *

Aktualizálás | Mégsem | Beszámoló



Projekt

Projekt szerződés adatok

Projekt

Projekt kód	11000111	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív	Státusz	Nyitott
Projekt név	<input type="text"/>		Létrehozás dátuma	2021.01.01
Projekt leírás	<input type="text"/>		Fázis	Szerződött
Periódus típus	Év		Utolsó frissítés dátuma	2023.01.05
Főprojekt kód	→ 110001			
Főprojekt név	<input type="text"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Csak szerződésen alapuló beszerzési bizonylatok befogadása			

Általános Menedzsment Megbízó Dátumok és becslések Visszatartások és Bankgarancia Pénzügy Periódusok Terv és tény adatok Szerződések Részletek Csatolmányok

Szerződés száma	A199/2023
Szerződés leírás	Megújított szerződés
Megjegyzés	<input type="text"/>
Üzleti lehetőség	→ <input type="text"/>

Aktualizálás Mégsem Beszámoló



Projekt

Projekt részletek

Projekt

Projekt kód	11000111	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív	Statusz	Nyitott
Projekt név	<input type="text"/>		Létrehozás dátuma	2021.01.01
Projekt leírás	<input type="text"/>		Fázis	Szerződött
Periódus típus	Év		Utolsó frissítés dátuma	2023.01.05
Főprojekt kód	→ 110001			
Főprojekt név	<input type="text"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Csak szerződésen alapuló beszerzési bizonylatok befogadása			

Általános | Menedzsment | Megbízó | Dátumok és becslések | Visszatartások és Bankgarancia | Pénzügy | Periódusok | Terv és tény adatok | Szerződések | **Részletek** | Csatolmányok

Frissen csatolt tervek szerint kell elvégezni a munkát. A szerződés meg lett újítva, minden tanúsítvány rendelkezésre áll.

Aktualizálás | Mégsem | Beszámoló



Költségvetési sorok

Terv és tényadatai

Költségvetési sorok

Projekt: 11000111

Projekt periódus: Év

Megjelenítés: Év

Periódus: Y - Év

Költségvetési sor	Költség	Periódus	Megjegyzés	Zárva	Partner kód	Partner neve	Szerződött	Mennyiségi egység	Jelölő-1	Jelölő-2	Jelölő-3	Mennyiség	Költség terv	Bevétel terv	Óraszám terv	Anyag ktg	Alvállalkozói ktg	Egyéb ktg	Összes könyvelt ktg	Bé...
24	Tartály	Y - Év		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Töltőállomás szerviz	Y - Év		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Év: 2023

Hónap: 2026-01

Negyedév: 2026-Q1

Teljes időszak: * - *

OK Mégsem

Importálás Projektből Importálás Excelből

Részletezés

A KPI-ok alátámasztásának érdekében

Projekt

Projekt kód: 11000111 Aktív

Projekt név:

Projekt leírás:

Státusz: Nyitott

Létrehozás dátuma: 2021.01.01

Fázis: Szerződött

Periódus típus: Év

Főprojekt kód: 110001

Főprojekt név:

Csak szerződésen alap...

Általános Menedzsment Megbízó Dátumok és

Megjelenítés: Év

Periódus: 2022

Terv számok:

Bevétel terv: 0,00

Tény számok:

Bevétel: 2.104.720,00

Anyag ktg: 84.740,00

Alvállalkozói ktg: 0,00

Egyéb ktg: 0,00


Összes könyvelt ktg: 84.740,00

Tény anyag ktg részletei - 11000111 projekt

Bizonylattípus	Bizonylatszám	ÜP ...	ÜP kód	Ü...	Könyvelési ...	Adó dátum	Tény Anya...	Nettó össz...	Nettó össz...	Pénznem	Megjegyzé...	Cikkszám	Le...
15	180688	3110013			2022.05.27	2022.05.27	3.807,00	3.807,00	0,00	Ft	Joó J.	8599909	Géprc
15	180688	3110013			2022.05.27	2022.05.27	1.869,00	1.869,00	0,00	Ft	Joó J.	8584517	Zsír M
15	180688	3110013			2022.05.27	2022.05.27	72.000,00	72.000,00	0,00	Ft	Joó J.	60658060	DÓMF
15	180688	3110013			2022.05.27	2022.05.27	451,00	451,00	0,00	Ft	Joó J.	60410060	Karim
15	180688	3110013			2022.05.27	2022.05.27	499,00	499,00	0,00	Ft	Joó J.	60410060	Karim
15	180688	3110013			2022.05.27	2022.05.27	720,00	720,00	0,00	Ft	Joó J.	60410060	Karim
15	180688	3110013			2022.05.27	2022.05.27	901,00	901,00	0,00	Ft	Joó J.	60410060	Karim
15	180688	3110013			2022.05.27	2022.05.27	1.360,00	1.360,00	0,00	Ft	Joó J.	8582512	Féktis
15	180688	3110013			2022.05.27	2022.05.27	1.716,00	1.716,00	0,00	Ft	Joó J.	8582501	Csava
15	180688	3110013			2022.05.27	2022.05.27	1.417,00	1.417,00	0,00	Ft	Joó J.	6599935	Norm
							84.740,00	84.740,00					

OK Mégsem

OK Mégsem

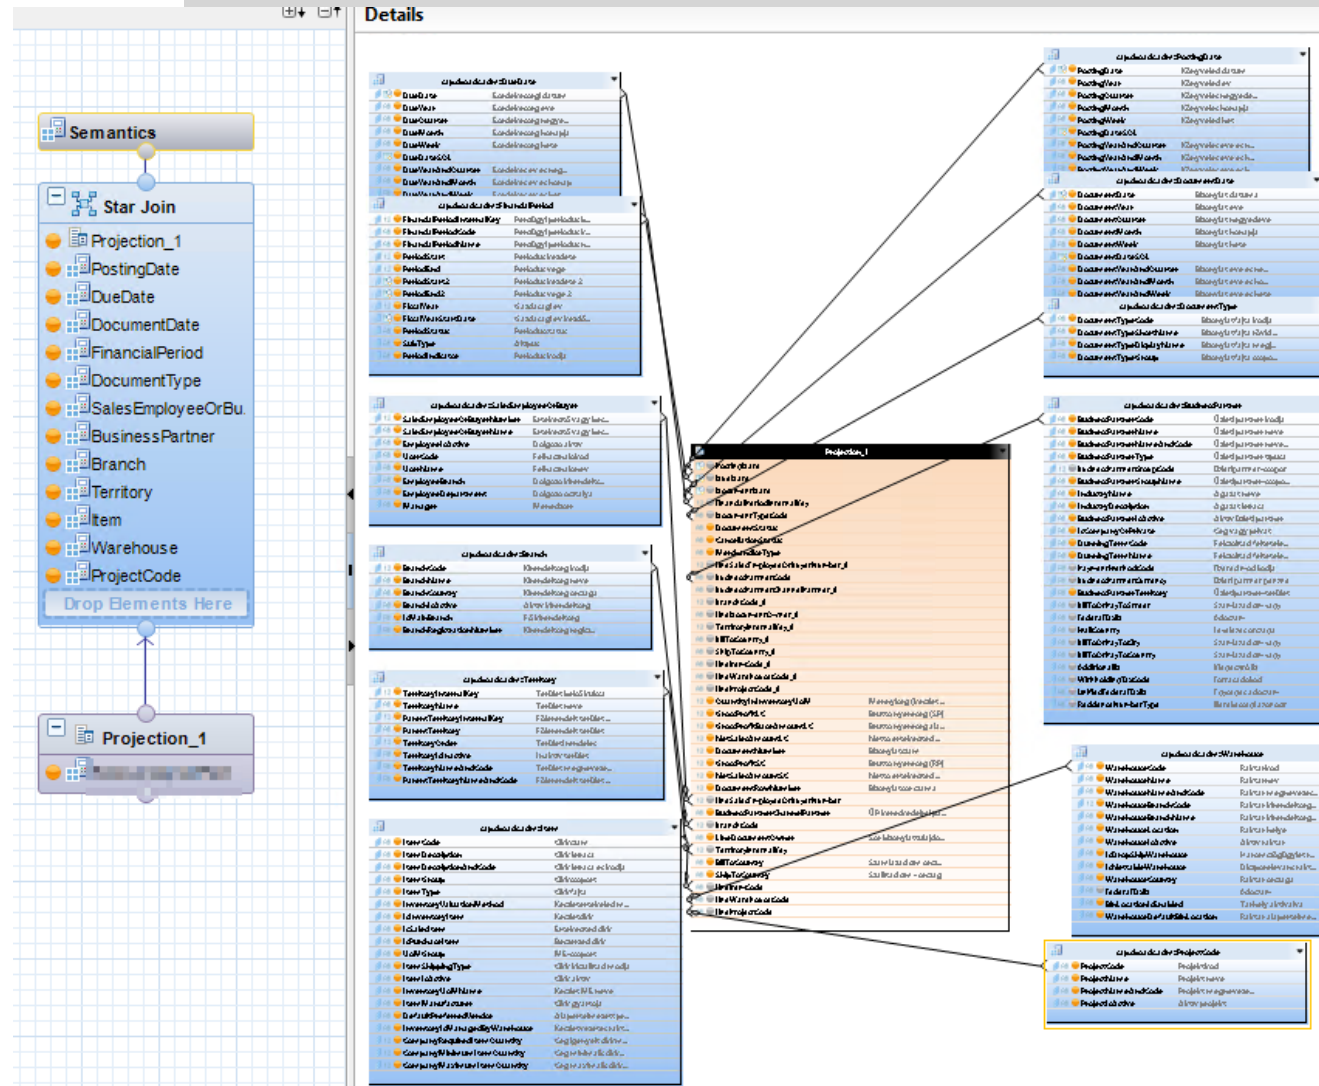

Belépve: [Név] | Jelszó módosítás |

Árubeérkezés

Anyagkiadás

Anyag visszavételezés

Beszerezési igény

Riportok

Anyagkiadás

PROJEKT
[Projekt neve]

Projektben lévő cikkek

KERESÉS

CIKKSZÁM	CIKK NEVE	TÁRHELY	KÉSZLET	ME	MENNYISÉG		MARADÉK	RENDELVE	BEÉRKEZÉS	
					-	+				
aco_... ACO...	Büzelző...kivezetéshez, anyagfogóval.	TÁRHELY	12	db	-	0	+	12	0	
aco_... ACO...	Büzelző...búzelzáró és ...nélkül DN100	TÁRHELY	13	db	-	0	+	13	0	
aco_... ACO...	Büzelző...búzelzáró és ...nélkül, DN150	TÁRHELY	11	db	-	0	+	11	0	
aco_... ACO...	Büzelző... (DO-hoz, DN110 ...)	TÁRHELY	13	db	-	0	+	13	0	
buda_Adhez... Adhez...	Adhez... aktív hígító 5 liter	9120... TÁRHELY	2	db	-	0	+	2	0	
buda_Adhez... Adhez...	Adhez... 9006 25 kg	9120... TÁRHELY	6	db	-	0	+	6	0	
buda_NITR... NITR...	NITR... 5 liter	9120... TÁRHELY	1	db	-	0	+	1	0	
csav_... CSAV...	CSAV... 18,l, Horganyzott, ...	TÁRHELY	10840	db	-	0	+	10840	50	2023-06-30

Belépve: Hagyományos (0)											Kijelentkezés
IRÁNYÍTÓPULT		ANYAGFELHASZNÁLÁS		ENGEDÉLYEZÉS		ANYAGIGÉNYLÉS LEADÁS		RİPORTOK		JELSZÓ MÓDOSÍTÁS	
Anyagfelhasználás											
PROJEKT: <input type="text" value="Központi Raktár - Működési utasításokkal kiépítése, tervezése"/>											
MINDEN CIKK, AMI A PROJEKTEN MEGFORDULT: <input type="checkbox"/>											
CIKKSZÁM / NÉV / KÖLTSÉGVETÉSI SOR <input type="text"/>											
Költségvetési sor	Cikkszám	Név	Raktár	Mennyiség	Fogyás	Felhasznál	Más projekten	Központi raktárban	Megrendelt	Rend.	
01 Felhasználó	AP0100001	100 db. 200x200x200 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	200,00	<input type="text"/>	0,00	1 138,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
01 Felhasználó	AP0100002	100 db. 100x100x100 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	100,00	<input type="text"/>	0,00	1 900,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
01 Felhasználó	AP0100003	150 db. 100x100x100 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	150,00	<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
01 Felhasználó	AP0100004	100 db. 100x100x100 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	100,00	<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
01 Felhasználó	AP0100005	100 db. 100x100x100 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	100,00	<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
01 Felhasználó	AP0100006	100 db. 100x100x100 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	225,00	<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
01 Felhasználó	AP0100007	100 db. 100x100x100 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	500,00	<input type="text"/>	0,00	2 150,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
01 Felhasználó	AP0100008	100 db. 100x100x100 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	6,00	<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
01 Felhasználó	BA0100009	100 db. 100x100x100 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	102,00	<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
01 Felhasználó	BA0100010	100 db. 100x100x100 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	60,00	<input type="text"/>	0,00	171,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
01 Felhasználó	BA0100011	100 db. 100x100x100 mm-es ALUMINUM RÁCS	4-PRHEL	60,00	<input type="text"/>	0,00	5,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	

#100877 Munkalap szerkesztése

[HIBAJEGY](#)
Projekt, helyszín

Teszt projekt 99999923

Értesítési email

valaki@szagoljat-el-azis.hu

Hiba leírása

teszt

[ALAPADATOK](#)
[FELHASZNÁLT ANYAGOK](#)
[VÁSÁROLT ANYAGOK](#)
[EGYÉB](#)
[KÜTÖSZLOPOK](#)
[ÜGYFÉLADATOK](#)

 Csak a kiválasztottakat mutassa

KÓD	NÉV	TÁRHELY	FELHASZNÁLÁS
10G53048	10G53048	23-1305	- 0 + / 1 db
10G53075	10G53075	23-1305	- 0 + / 1 db
10G89007	10G89007	23-1305	- 0 + / 1 db
10G99811	10G99811	23-1305	- 0 + / 1 DB
10S52011	10S52011	23-1305	- 0 + / 3 db
10T99908	10T99908	23-1305	- 0 + / 1 db
1509021	1509021	23-1305	- 0 + / 9 db
15090211	15090211	23-1305	- 0 + / 1 db
2099909	2099909	23-1305	- 0 + / 50 db
2099910	2099910	23-1305	- 0 + / 50 db





Köszönöm a figyelmet!

Molnár Zoltán

SAP Business One
vezető tanácsadó / senior consultant

Mobil: +36 20 352 8025

E-mail: zmolnar@techwave.hu

SAP Business One workshop sorozat

27 / 9 / 2023

SAP Business One web client

Bartha Zoltán

04 / 10 / 2023

SAP Business One Projekt kontrolling bővítmény

Molnár Zoltán

11 / 10 / 2023

Web alapú megoldások SAP Business One-hoz

Szabolcsi Péter
